Portfolio FTTH

Pilotage opérationnel • Data & BI

Programme | Prestataires | Planning | Blocages

Besoin métier

Piloter l'avancement physique du réseau

Suivre les travaux, comparer les cinq prestataires et comprendre les écarts entre le planning et les travaux réalisés.

Déploiement FTTH dans l'Hérault

Périmètre et sources

150 000 EL	450 PM	5	02/10/2026
Périmètre	Mutualisation	Prestataires	Reporting • 2026-S40

suivi_cables	25 033 lignes
suivi_boites	25 033 lignes

Communes réelles • Adresses fictives

Trois axes de pilotage

01

Avancement du programme

Où en est le déploiement ?

Câbles tirés • Boîtes posées • EL recettés

Page Programme

02

Performance des prestataires

Les objectifs sont-ils tenus ?

Livraisons mensuelles • Comparaisons des cinq prestataires

Page Prestataires

03

Ecarts et blocages

Pourquoi le réalisé s'écarte-t-il du planning ?

Planifié / réalisé • Causes et durée des blocages

Page Planning et Blocages

Méthode

BigQuery Structurer → **Python** Vérifier → **Power BI** Restituer

EL livré : recette optique réalisée.
PM terminé : tous les câbles tirés et toutes les boîtes recettées.

Limites et accès aux pages

Données 100 % synthétiques
Planning déclaré par les prestataires
Un incident majeur par élément • Octobre 2026 partiel

Voir la page Programme | Voir la page Conclusion

Programme

Avancement physique du déploiement FTTH

Tout

Introduction | Prestataires | Planning | Blocages

Reporting arrêté au 02/10/2026 • Semaine 2026-S40

EL prévus

150 000

Périmètre du programme

EL recettés

87 294

Recette optique réalisée

Avancement

58,2 %


EL recettés / EL prévus

PM terminés


250 / 450

Nombre de PM terminés

Cumul des EL recettés depuis février 2025

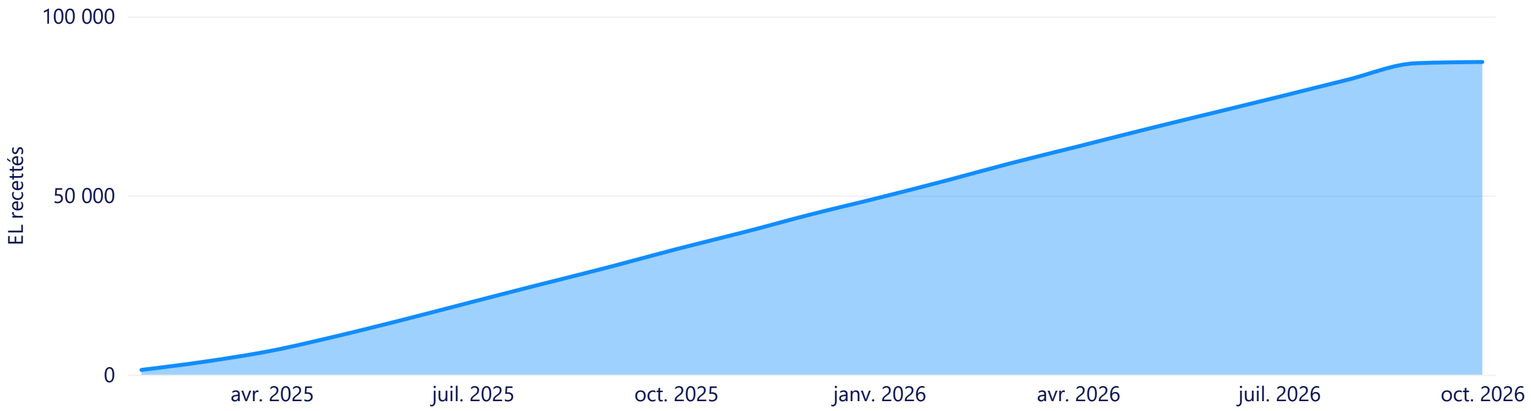

Etats des points de mutualisation

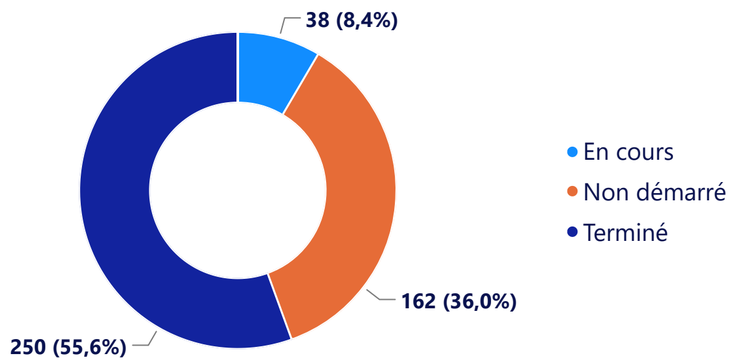

Détails des Points de mutualisation

PM	Prestataires	Commune	Câbles tirés	EL prévus	EL recettés	Avancement	État PM
PM001	PREST_A	Montpellier	57	346	346	100,0 %	Terminé
PM002	PREST_A	Lattes	56	366	366	100,0 %	Terminé
PM003	PREST_A	Castelnau-le-Lez	57	360	360	100,0 %	Terminé
PM004	PREST_A	Saint-Jean-de-Védas	58	344	344	100,0 %	Terminé
Total			**15 438**	**150 000**	**87 294**	**58,2 %**	

Conclusion et recommandations

Prestataires

Livraisons et atteinte des objectifs mensuels

Tout

Introduction | Programme | Planning | Blocages

Reporting arrêté au 02/10/2026 • Semaine 2026-S40

Mois analysé : septembre 2026

EL recettés du mois

4 614

Dernier mois complet

Objectif mensuel

4 250

850 EL x 5 prestataires

Atteinte de l'objectif

108,6 %


EL recettés / objectif mensuel

Prestataires à l'objectif


5 / 5

Carte prestataires à l'objectif

EL recettés par prestataire • septembre 2026

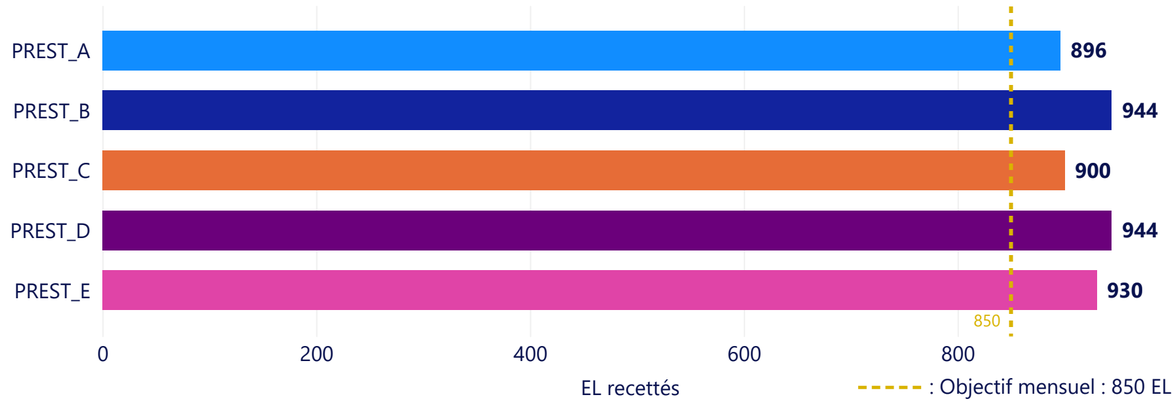

Evolution mensuelle des EL recettés sur les cinq derniers mois

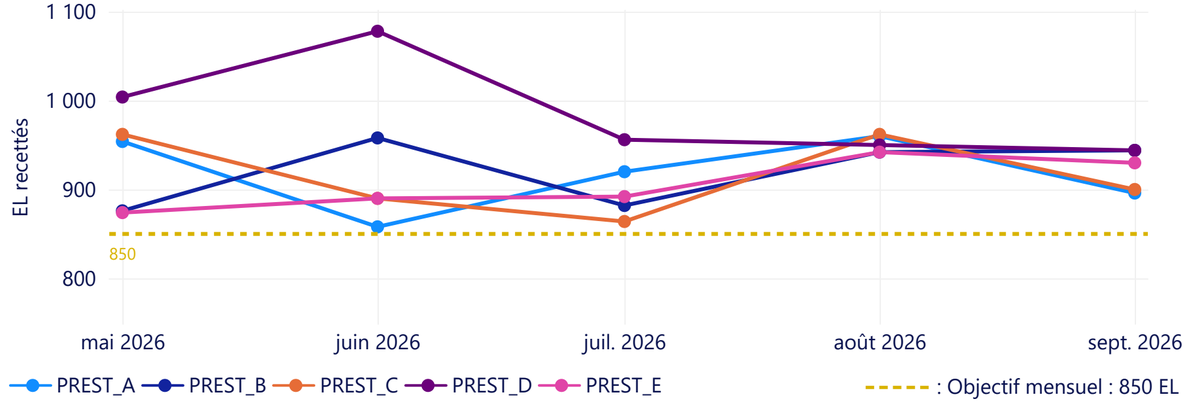

Synthèse par prestataires • septembre 2026

Prestataire	EL recettés	Objectif EL	Écart EL	Atteinte	Situation
PREST_A	896	850	46	105,4 %	Objectif atteint
PREST_B	944	850	94	111,1 %	Objectif atteint
PREST_C	900	850	50	105,9 %	Objectif atteint
PREST_D	944	850	94	111,1 %	Objectif atteint
Total	**4 614**	**4 250**	**364**	**108,6 %**	**5 sur 5**

Conclusion et recommandations

Planning

Fiabilité du planning déclaré par les prestataires

Tout

Introduction | Programme | Prestataires | Blocages

Reporting arrêté au 02/10/2026 • Semaine 2026-S40

Période : S37 à S40 • Echéances jusqu'au 02/10

Opérations échues

3 647

Echéance atteinte au reporting

Opérations tenues

2 336

Réalisées à la date prévue

Fiabilité du planning

64,1 %


Opérations tenues / opérations échues

Opérations replanifiées


1 311

Parmi les opérations échues

Opérations échues et tenues par semaine

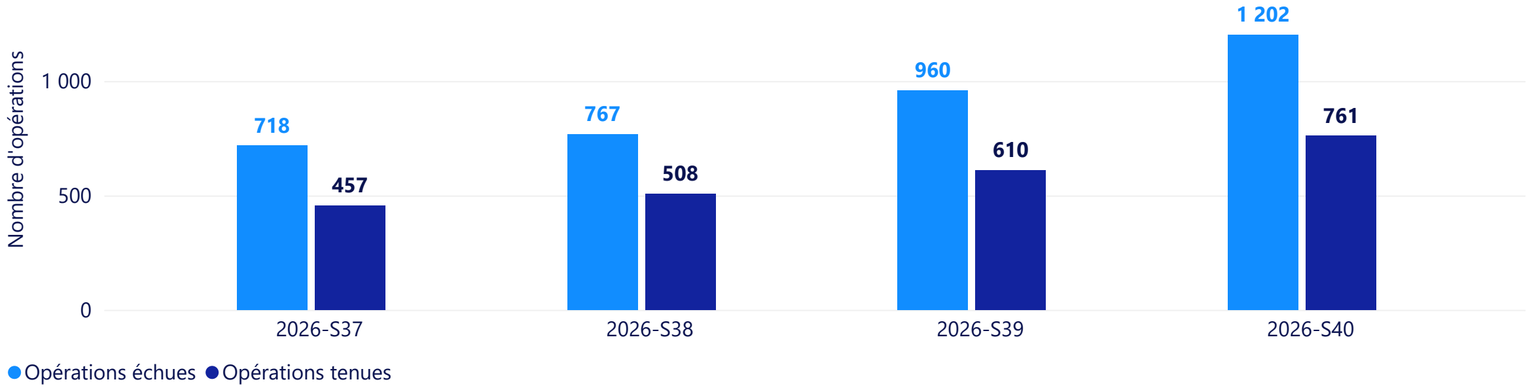

Fiabilité du planning par horizon de prévision

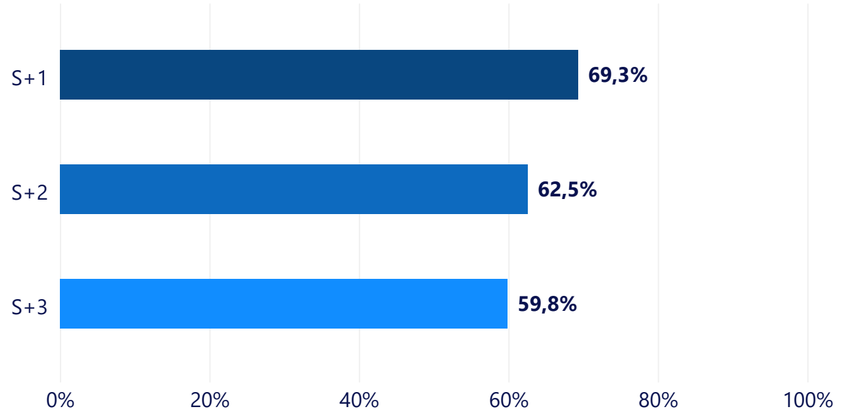

Synthèse du planning par prestataires

Prestataire	Opérations échues	Opérations tenues	Fiabilité planning	Opérations replanifiées
PREST_A	741	510	68,8 %	231
PREST_B	702	453	64,5 %	249
PREST_C	737	516	70,0 %	221
PREST_D	758	405	53,4 %	353
Total	**3 647**	**2 336**	**64,1 %**	**1 311**

Conclusion et recommandations

Blocages

Causes et ancienneté des éléments bloqués

Tout

Introduction | Programme | Prestataires | Planning

Reporting arrêté au 02/10/2026 • Semaine 2026-S40

Périmètre : blocages actifs

Eléments bloqués

209

Câbles et boîtes • Blocage actif

Taux de blocage

18,4 %

Éléments bloqués / éléments actifs

Ancienneté moyenne

7 jours


Depuis la détection du blocage

Part d'origine étude


23,9 %

Parmi les éléments bloqués

Répartition des éléments bloqués par cause

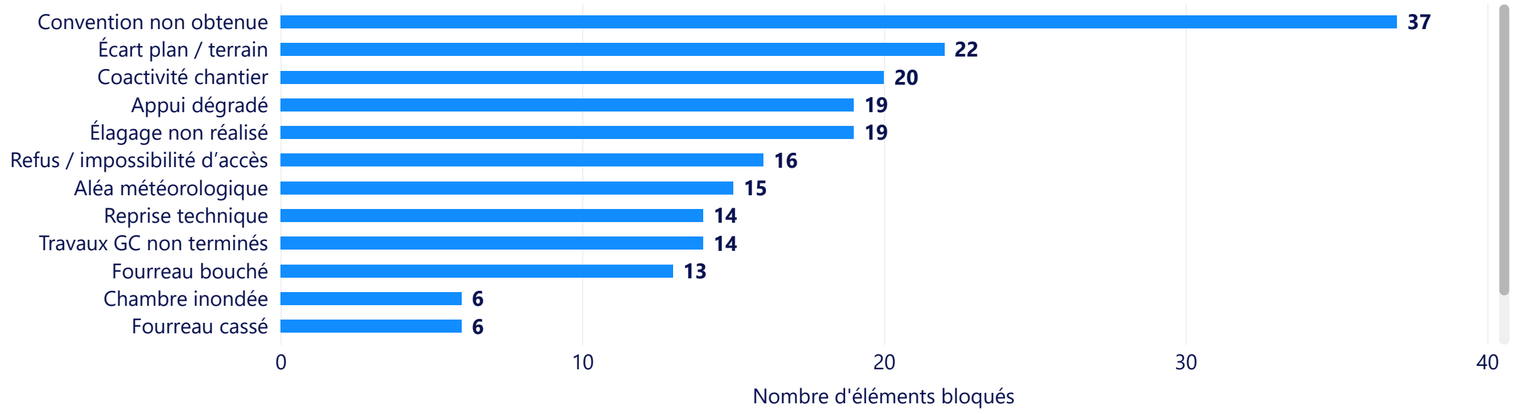

Ancienneté des éléments bloqués

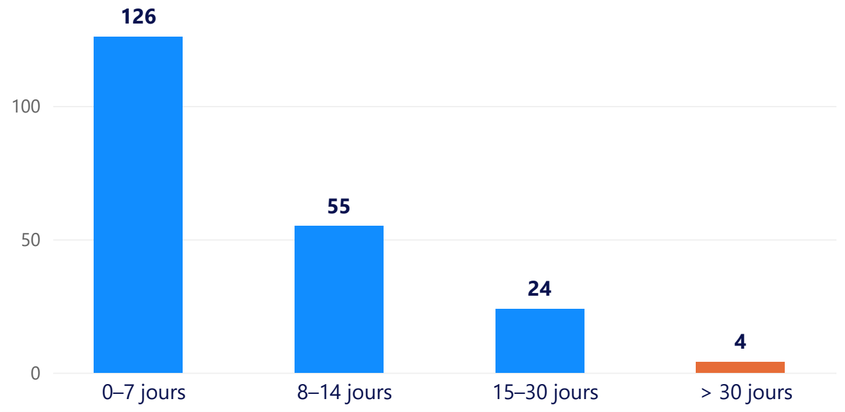

Synthèse des blocages actifs par prestataires

Prestataire	Éléments bloqués	Taux blocage	Blocages origine étude	Blocages origine chantier
PREST_A	37	16,4 %	6	31
PREST_B	43	18,8 %	9	34
PREST_C	41	18,0 %	14	27
PREST_D	39	17,0 %	7	32
Total	**209**	**18,4 %**	**50**	**159**

Conclusion et recommandations

Bilan du déploiement et pistes d'action

Introduction

Reporting arrêté au 02/10/2026 • Semaine 2026-S40

Vue globale • Tous prestataires

Programme

Où en est le déploiement ?

Au 2 octobre 2026, **58,2 % du programme est recetté**, soit 87 294 EL sur 150 000. Parmi les 450 PM, **250 sont terminés**. Sans trajectoire prévisionnelle globale, cet avancement ne permet pas de conclure à une avance ou à un retard.

Action proposée
Faire le point sur les PM en cours pour identifier ceux qui peuvent être terminés et recettés en priorité.

Voir la page Programme

Prestataires

Les objectifs mensuels sont-ils tenus ?

En septembre 2026, **les cinq prestataires atteignent leur objectif mensuel**. Les 4 614 EL recettés représentent **108,6 % de l'objectif collectif**. Ce résultat positif doit être complété par l'examen de la régularité des livraisons.

Action proposée
Suivre les livraisons de chaque prestataire d'un mois à l'autre et échanger avec lui lorsque la production baisse.

Voir la page Prestataires

Planning

Les engagements de planning sont-ils respectés ?

Sur S37 à S40, **64,1 % des opérations échues respectent le planning**, soit 2 336 sur 3 647. La fiabilité diminue entre les horizons S+1 et S+3. Atteindre l'objectif mensuel ne signifie donc pas nécessairement tenir les engagements hebdomadaires.

Action proposée
Reprendre avec les prestataires les opérations décalées pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et mieux préparer les semaines suivantes.

Voir la page Planning

Blocages

Quels obstacles sont recensés dans le déploiement ?

Au reporting, **209 éléments présentent un blocage actif**, dont **quatre depuis plus de 30 jours**. Les principales causes recensées sont les conventions non obtenues, les écarts entre le plan et le terrain et la coactivité chantier.

Action proposée
Voir avec les prestataires comment résoudre les blocages, en donnant la priorité à ceux qui durent et freinent le plus les travaux.

Voir la page Blocages
